

**RFC emisor:** HEMO9904058M9  
**Nombre emisor:** OSCAR ALEXIS HERNANDEZ MOSCOSO  
**Folio:** 02  
**RFC receptor:** MAX850101AJ1  
**Nombre receptor:** MUNICIPIO DE AXUTLA  
**Uso CFDI:** Por definir

**Folio fiscal:** 6A7C0EE4-786B-4C9C-9415-6D96A75705D4  
**No. de serie del CSD:** 00001000000509914974  
**Serie:** P  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 62740 2022-03-08 09:33:04  
**Efecto de comprobante:** Pago  
**Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
84111506		1	ACT		0	0			
<b>Descripción</b>	Pago								

**Moneda:** Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda  
**Subtotal Total** \$ 0.00  
**Total** \$ 0.00

### Información del pago

**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
**Fecha de pago:** 2022-03-07 00:00:00  
**Moneda de pago:** Peso Mexicano  
**Monto:** 108206.82

#### Documento relacionado

**Id documento:** CC86CE78-940A-4FEA-BD8A-3E6B67BF59AF  
**Folio:** 01  
**Serie:** V  
**Número parcialidad:** 2  
**Moneda del documento relacionado:** Peso Mexicano  
**Método de pago del documento relacionado:** Pago en parcialidades o diferido  
**Importe de saldo anterior:** 205936.98  
**Importe pagado:** 108206.82  
**Importe de saldo insoluto:** 97730.16

**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
**Fecha de pago:** 2022-03-07 00:00:00  
**Moneda de pago:** Peso Mexicano  
**Monto:** 97730.16

#### Documento relacionado

**Id documento:** CC86CE78-940A-4FEA-BD8A-3E6B67BF59AF  
**Folio:** 01  
**Serie:** V  
**Número parcialidad:** 3  
**Moneda del documento relacionado:** Peso Mexicano  
**Método de pago del documento relacionado:** Pago en parcialidades o diferido  
**Importe de saldo anterior:** 97730.16  
**Importe pagado:** 97730.16  
**Importe de saldo insoluto:** 0

RFC emisor: HEMO9904058M9

Folio fiscal:

6A7C0EE4-786B-4C9C-9415-6D96A75705D4

**Sello digital del CFDI:**

jraazoZxoFjSGFQz/IA0VKj/1yo52KLK2rA2jrQFKmhoaxuakRy46KdgbKOet3ijWYcxzEnlW5y2fQTWtsN13KV/2GuCealxgR621EqS3pUte9t8z+GLw/BoenZr3EtHEvYOSv4N7ieZwgftuvq7Qu  
g514kLk/Z3YZdVbYdgg+YLcqONhZSPpsDeb4F4tNTOJU5FNkPO1urLTJWMmaeY+QeaW+sfGODEGEeJB5u/FIa4SEb36oqTBwoJ9FIGJ8vrqLHe9ahzNa/7u8NIDCbonhptaSoTBv5nYQg  
ptE+7CpX2URXo1qVUki59Y3oguu1ywVsr1fRj7qpaotgLrJ+w==

**Sello digital del SAT:**

kB0i2+9ge/8ndy2tpYotznb0mVwujJzdc0dV4FJn9EPHZYrijsQdBRFtI6VzMmoEnKNtZnGf3FbvDzxnxvJiYfvYkzjMUzwxInOudeJO/pD0BuN2ial4CgrUD87klmvWoB/WkOhjOHR42lBa0+Bhn  
ylZcY0zWkQ876nwlRd0WSm1wibvbjgbbF2UtbB+FaQP+MTBN8XshsKn0khqUPc6XilTqqLUWRuASufdQc8VM8qHSdzEFjExfRY6Sez6Di9XnS9b0axl7V8SlrDTokEGWn7T6bP7b6KQ4zX  
UcpFLwncHlfGnwzcVALBAggEs+X7lu9BrBlhiGAwtRF3lQA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|6A7C0EE4-786B-4C9C-9415-6D96A75705D4|2022-03-08T09:46:19|SAT970701NN3||jraazoZxoFjSGFQz/IA0VKj/1yo52KLK2rA2jrQFKmhoaxuakRy  
46KdgbKOet3ijWYcxzEnlW5y2fQTWtsN13KV/2GuCealxgR621EqS3pUte9t8z+GLw/BoenZr3EtHEvYOSv4N7ieZwgftuvq7QuG514kLk/Z3YZdVbYdgg+YL  
cqONhZSPpsDeb4F4tNTOJU5FNkPO1urLTJWMmaeY+QeaW+sfGODEGEeJB5u/FIa4SEb36oqTBwoJ9FIGJ8vrqLHe9ahzNa/7u8NIDCbonhptaSoTBv5  
nYQgptE+7CpX2URXo1qVUki59Y3oguu1ywVsr1fRj7qpaotgLrJ+w==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-03-08 09:46:19

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028





07/03/2022 4:18:06 PM

COMPROBANTE

## Mis operaciones frecuentes - Traspos a otros bancos

## MUNICIPIO DE AXUTLA PUEBLA

07/03/2022

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0117667914
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE
Cuenta de depósito:	072662011734171107
Nombre corto:	TESORERIA
Importe:	\$108,206.82
Fecha de operación:	07/03/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	FINIQUITO
Referencia numérica:	001
Clave de rastreo:	BNET01002203070026051451
Hora de Operación:	16:18:06
Folio de internet:	9235373507

## Datos del beneficiario

Nombre: OSCAR ALEXIS HERNANDEZ MOSCOSO



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir



07/03/2022 4:22:51 PM

COMPROBANTE

## Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE AXUTLA PUEBLA

07/03/2022

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0117667949
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE
Cuenta de depósito:	072662011734171107
Nombre corto:	TESORERIA
Importe:	\$97,730.16
Fecha de operación:	07/03/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	FINIQUITO CANCHAS
Referencia numérica:	0001
Clave de rastreo:	BNET01002203070026052945
Hora de Operación:	16:22:51
Folio de internet:	8235373516

## Datos del beneficiario

Nombre: OSCAR ALEXIS HERNANDEZ MOSCOSO



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir



H. AYUNTAMIENTO DE AXUTLA, PUEBLA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBO -COMPROBANTE PARA REVISION DE ESTIMACIONES Y FINIQUITO

NOMBRE DE OBRA: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

CONTRASTISTA : CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES NUM. DE CONTRATO: MAX-OP-INV3-01/2021 NÚM. DE OBRA 202101

MUNICIPIO: AXUTLA LOCALIDAD: HUEHUEPIAXTLA

ORIGEN DE LOS RECURSOS

<input checked="" type="checkbox"/>	FIS MDF 2021:	<input type="checkbox"/>	RECURSOS PROPIOS 2021	<input type="checkbox"/>	ESTATAL 2021:
<input checked="" type="checkbox"/>	FORTAMUNDF 2021:	<input checked="" type="checkbox"/>	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS 2021	<input type="checkbox"/>	FEDERAL 2021:
<input type="checkbox"/>	PARTICIPACIONES 2021:			<input type="checkbox"/>	OTROS 2021:

ESPECIE (CEMENTO)

ESTIMACION NUM. 2 (DOS) FQTO  NORMAL  FINIQUITO

REVISION No:  1  SOLVENTADA  NO SOLVENTADA

P. ARQ. LEONEL DOMÍNGUEZ ORTIZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES

ARQ. EFRAIN PÉREZ LUNA



FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	FECHA COMPROMISO SOLVENTACIÓN
07-feb-22	N/A	N/A


REVISION No:   SOLVENTADA  NO SOLVENTADA

P. ARQ. LEONEL DOMÍNGUEZ ORTIZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES

OBSERVACIONES:

ARQ. EFRAIN PÉREZ LUNA  
RESIDENTE DE OBRA

FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	FECHA COMPROMISO SOLVENTACIÓN



DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES  
AUGUST 1988  
HHS/PHS



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXUTLA**

**CONTRATO NÚMERO:** MAX-OP-INV3-01/2021  
**DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS**  
**NÚMERO DE ESTIMACIÓN:** 2(DOS) FINIQUITO  
**NOMBRE DE LA OBRA:** DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.  
**UBICACIÓN:** HUEHUEPIAXTLA  
**FECHA DE ELABORACIÓN:** 7 de febrero de 2022  
**PERIODO DE EJECUCIÓN:** 22 de diciembre de 2021 AL 31 de enero de 2022  
**PERIODO DE CONTRATO:** 15 de diciembre de 2021 AL 31 de enero de 2022  
**CONTRATISTA:** CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES  
**NÚMERO DE OBRA:** 202101  
**ESTADO DE CUENTA**



IMPORTE DEL CONTRATO SIN I.V.A.	\$ 480,531.88
IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.	\$ 557,416.98

ANTICIPO SIN I.V.A.	\$ -
ANTICIPO CON I.V.A.	\$ -

FUENTE FINANCIAMIENTO:	DEPARTAMENTALES	( )	FISM 2021	FORTAMUN 2021
	MUNICIPALES	( X )	( X )	( X )

ESTIMACIÓN N°.	PERIODO	IMPORTE ESTIMACIÓN	I.V.A.	TOTAL	AMORTIZACIÓN			TOTAL PENALIZACIÓN	TOTAL DEVOLOCIÓN	LIQUIDO A PAGAR	FACTURA N°.	FECHA
					ANTICIPO	I.V.A.	TOTAL					
ESTIMACION 01 (UNO).	15-dic-21	\$ 303,000.00	\$ 48,480.00	\$ 351,480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 351,480.00	FAC. 3E6B67BF59AF / C.P. 74FDE7E88E2E	21-dic-21
	AL 21-dic-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
ESTIMACION 2 (DOS) FQTO.	22-dic-21	\$ 177,531.88	\$ 28,405.10	\$ 205,936.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 205,936.98	FAC. 3E6B67BF59AF / C.P. 6D96A75705D4	08-mar-22
	AL 31-ene-22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
<b>SUMA:</b>		\$ 480,531.88	\$ 76,885.10	\$ 557,416.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 557,416.98		

SALDO TOTAL POR COBRAR CON I.V.A.	\$ -
-----------------------------------	------

SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO CON I.V.A.	\$ -
---	------

AVANCE FINANCIERO:	100.00%
--------------------	---------

AVANCE FISICO EN %.	100.00%
---------------------	---------

**CONTRATISTA:**

**REPRESENTANTE LEGAL**  
C. OSCAR ALEXIS HERNÁNDEZ MOSCOSO

**REVISÓ:**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y RESIDENTE DE OBRA**  
ARMO FRAÍN PÉREZ LUNA

**AUTORIZÓ:**



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
C. JAIME GUZMÁN VIELMA

**AUTORIZÓ:**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
C. MARIO ANTONIO MONGE ZUÑIGA

**AUTORIZÓ:**


**CONTRALORA MUNICIPAL**  
C. ITZEL CRUZ LUIS



SECRET  
NO FORN DISSEM




SECRET  
NO FORN DISSEM



SECRET  
NO FORN DISSEM



SECRET  
NO FORN DISSEM



SECRET  
NO FORN DISSEM







**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXITLA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

CONTRATO NÚMERO: MAX-OP-INV3-017/2021 NÚMERO DE ESTIMACIÓN: 2(DOS) FENIQUITO  
 NOMBRE DE LA OBRA: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXITLA, MUNICIPIO DE AXITLA, PUEBLA.  
 UBICACIÓN: HUEHUEPIAXITLA FECHA DE ELABORACIÓN: 7 de febrero de 2022  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 31 de enero de 2022 AL 31 de enero de 2022 HOJA: 1 DE 2  
 PERIODO DE CONTRATO: 15 de diciembre de 2021 AL 31 de enero de 2022  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES NÚMERO DE OBRA: 202101



**ESTIMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO**

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO				ESTIMACIÓN ANTERIOR				ESTIMACIÓN 2 (DOS) IQTO.				ACUMULADO	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	PONDERADO %	CANTIDAD	IMPORTE	AVANCE %	CANTIDAD	IMPORTE	AVANCE %	CANTIDAD	IMPORTE	AVANCE %
1.00	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES														
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	967.82	\$ 9,2200	8,923.30	1.857%	967.820	8,923.30	100.000%	0.0000	0.00	0.000%	967.8200	8,923.30	100.000%
11007	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 A 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRRO TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	967.82	\$ 35,2000	34,067.26	7.089%	967.820	34,067.26	100.000%	0.0000	0.00	0.000%	967.8200	34,067.26	100.000%
EXCA021	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO I	M3	483.91	\$ 18,4300	8,918.46	1.856%	483.910	8,918.46	100.000%	0.0000	0.00	0.000%	483.9100	8,918.46	100.000%
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO. CARGA MECANICA	M3	629.08	\$ 45,8000	28,811.86	5.996%	629.080	28,811.86	100.000%	0.0000	0.00	0.000%	629.0800	28,811.86	100.000%
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TREPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CMS CON PISON DE MANO. HUMEDECENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACION. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS. MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	193.20	\$ 415,6000	80,293.92	16.709%	193.200	80,293.92	100.000%	0.0000	0.00	0.000%	193.2000	80,293.92	100.000%
GLA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F' C = 150 KG/CM <sup>2</sup> DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACION DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METALICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO)	M	55.40	\$ 168,8900	9,356.51	1.947%	55.400	9,356.51	100.000%	0.0000	0.00	0.000%	55.4000	9,356.51	100.000%
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	M2	966.02	\$ 56,2000	54,290.32	11.298%	304.000	17,084.80	31.469%	662.0200	37,205.52	68.531%	966.0200	54,290.32	100.000%
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRITILLA Y BOTES FC=250 KG/CM <sup>2</sup> REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION. INCLUYE: ELABORACION, CURADO Y VACIADO. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO)	M3	115.70	\$ 834,1500	96,311.16	20.084%	38.000	31,697.70	32.844%	77.7000	64,813.46	67.156%	115.7000	96,311.16	100.000%
PICAC005	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS.	M2	964.22	\$ 23,3700	22,533.82	4.689%	292.948	6,846.19	30.382%	671.2720	15,687.63	69.618%	964.2200	22,533.82	100.000%
31577	MURO DE BLOCK MAGZO DE CEMENTO DE 15X20X40CM DE 15CM. ESPESOR. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO)	M2	39.96	\$ 253,5500	10,131.86	2.108%	0.000	0.00	0.000%	39.9600	10,131.86	100.000%	39.9600	10,131.86	100.000%
CAS085	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 15 CM. CONCRETO FC=150 KG/CM <sup>2</sup> -3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 15 - 4. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO).	M	22.80	\$ 341,5500	7,787.34	1.621%	0.000	0.00	0.000%	22.8000	7,787.34	100.000%	22.8000	7,787.34	100.000%
REMU011	REFELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO).	M2	42.05	\$ 80,4200	3,381.66	0.704%	0.000	0.00	0.000%	42.0500	3,381.66	100.000%	42.0500	3,381.66	100.000%
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	99.10	\$ 32,4200	3,212.82	0.669%	0.000	0.00	0.000%	99.1000	3,212.82	100.000%	99.1000	3,212.82	100.000%



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXUTLA**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

MAX-OP-INV3-01/2021

NÚMERO DE ESTIMACIÓN:

2(DOS) FINIQUITO

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

HUEHUEPIAXTLA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 7 de febrero de 2022

22 de diciembre de 2021

31 de enero de 2022

15 de diciembre de 2021

AL

31 de enero de 2022

**PERIODO DE EJECUCIÓN:**

AL

31 de enero de 2022

**PERIODO DE CONTRATO:**

AL

31 de enero de 2022

**CONTRATISTA:**

CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES

NÚMERO DE OBRA:

202101



**ESTIMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO**

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMADO ANTERIOR			ESTIMACION 2 (DOS) FQTO.			ACUMULADO					
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	PONDERADO %	CANTIDAD	IMPORTE	AVANCE %	CANTIDAD	IMPORTE	AVANCE %				
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	964.22	\$ 7,5400	7,270.22	1.513%	0.000	0.00	0.0000%	964.2200	7,270.22	100.0000%	964.2200	7,270.22	100.0000%	
CANCH004	SUBMINISTRACION Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 8 CM DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACION DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS.	ML	423.77	\$ 34,5400	14,637.02	3.046%	0.000	0.00	0.0000%	423.7700	14,637.02	100.0000%	423.7700	14,637.02	100.0000%	
CANCH001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PARA CANCHA DE VOLEIBOL DE TUBO NEGRO C-40 DEC 0.65 M DE LONGITUD DE 3" DE DIAMETRO Y 2.5 M DE LONGITUD DE 2 1/2" DIAMETRO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00	\$ 2,850.0000	5,700.00	1.186%	0.000	0.00	0.0000%	2.0000	5,700.00	100.0000%	2.0000	5,700.00	100.0000%	
CANCH013	SUMINISTRO DE RED DE VOLEIBOL.	PZA	1.00	\$ 585.3500	585.35	0.122%	0.000	0.00	0.0000%	1.0000	585.35	100.0000%	1.0000	585.35	100.0000%	
S/C	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LEDS MARCA SAMSUNG O SIMILAR MODELO WALLY-RN-75W BATERIA DE LITIO Y PANEL SOLAR, INCLUYE: POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 8 METROS CON PLACA BASE DE ACERO Y BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL 50X60X65 CM, BRAZO DE METAL DE 1M Y DE 2" DE DIAMETRO.	PZA	4.00	\$ 19,250.0000	77,000.00	16.024%	4.000	77,000.00	16.024%	0.0000	0.00	0.0000%	4.0000	77,000.00	16.024%	
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	ML	210.000	33,900	7,119.00	1.481%	0.000	0.00	0.0000%	210.000	7,119.00	100.0000%	210.0000	7,119.00	100.0000%	
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>480,531.88</b>			<b>SUBTOTAL</b>	<b>303,000.00</b>			<b>SUBTOTAL</b>	<b>177,531.88</b>			<b>SUBTOTAL</b>	<b>480,531.88</b>
		<b>L.V.A.</b>		<b>76,885.10</b>	<b>100.00%</b>		<b>L.V.A.</b>	<b>48,480.00</b>	<b>6.5%</b>		<b>L.V.A.</b>	<b>28,405.10</b>	<b>36.94%</b>		<b>L.V.A.</b>	<b>76,885.10</b>
		<b>TOTAL:</b>		<b>557,416.98</b>	<b>REVISO:</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>351,480.00</b>	<b>AUTORIZO:</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>205,936.98</b>	<b>TOTAL:</b>		<b>557,416.98</b>	

CONTRATISTA:

P. ARQ. CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

REVISÓ:

ARQ. FERRUCO MORALES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA  
2021-2024

AUTORIZO:

C. JANET MALLEN VIELMA  
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO:

C. MARCO ANTONIO ZARAGOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA  
2021-2024

AUTORIZO:

CITZEL CRUZ LUIS  
CONTRALORA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
AXUTLA, PUEBLA  
2021-2024





TESORERÍA MUNICIPAL  
AXUTLA, PUEBLA  
2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AXUTLA, PUEBLA  
2021-2024



CONTRALORIA MUNICIPAL  
AXUTLA, PUEBLA  
2021-2024











**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXUTLA**

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS  
NÚMERO DE ESTIMACIÓN:

2(DOS) FINIQUITO

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.



URBANA  
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES

FECHA DE ELABORACIÓN:

lunes, 7 de febrero de 2022

AL 31 de enero de 2022

HOJA: 4 DE 10

AL 31 de enero de 2022

HUEHUEPIAXTLA



22 de diciembre de 2021

AL

31 de enero de 2022

15 de diciembre de 2021

**NÚMROS GENERADORES**

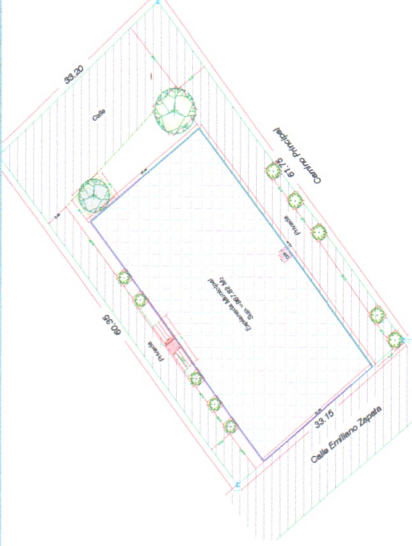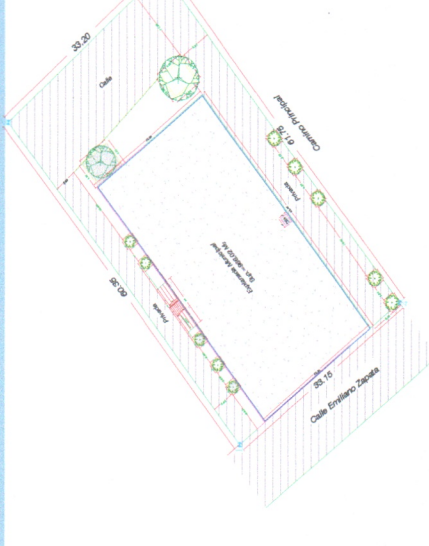CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			PIEZA	VOLUMEN		CROQUIS	
			EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO		ÁREA	PARCIAL		TOTAL
M2	SUMINISTRO, HABITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	M2	AREA DE CANCHA MENOS AREA DE POZO		43.40 1.50	22.30 1.20			967.82 1.80	966.02		
TOTAL GENERADO 966.02 COBRADO EN ESTA ESTIMACION <b>662.02</b> ESTIMADO ANTERIOR: 304.00 POR ESTIMAR: 0.00												
M3	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRITILLA Y BOTES FC=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, CURADO Y VACIADO, (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARAN EL CEMENTO)	M3	AREA DE CANCHA MENOS AREA DE POZO		43.40 1.50	22.30 1.20			967.82 1.80	116.14 0.22	115.70	
TOTAL GENERADO 115.70 COBRADO EN ESTA ESTIMACION <b>77.70</b> ESTIMADO ANTERIOR: 38.00 POR ESTIMAR: 0.00												

CONTRATO NÚMERO: MAX-OP-INV3-01/2021  
NOMBRE DE LA OBRA: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS  
NÚMERO DE ESTIMACIÓN: 2(DOS) FINIQUITO  
FECHA DE ELABORACIÓN: lunes, 7 de febrero de 2022  
AL 31 de enero de 2022  
AL 31 de enero de 2022





URBANA  
CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES

HOJA: 5 DE 10

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	DIMENSIONES		ÁREA	PIEZA	VOLUMEN	
			EJE	TRAMO		ANCHO	ALTO			PARCIAL	TOTAL
PICAC005	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS.	M2	AREA DE CANCHA MENOS AREA DE POZO		1.50	1.20		966.02 1.80		966.02 1.80	964.22
<p>TOTAL GENERADO 964.22 COBRADO EN ESTA ESTIMACION 671.27 ESTIMADO ANTERIOR: 292.95 POR ESTIMAR 0.00</p>											
		M2	1 2 A	A-B B-A 1-2	18.00 5.00 17.70	0.72 0.72 0.72		12.96 3.60 12.74	1.00 1.00 2.00	12.96 3.60 25.49	12.96 3.60 25.49
			0.15	0.72	0.11				-19.00	-2.09	-2.09
31577	MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO DE 15X20X40CM DE 15CM. ESPESOR. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMLIN. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO)										
<p>TOTAL GENERADO 39.96 COBRADO EN ESTA ESTIMACION 39.96 ESTIMADO ANTERIOR: 0.00 POR ESTIMAR 0.00</p>											

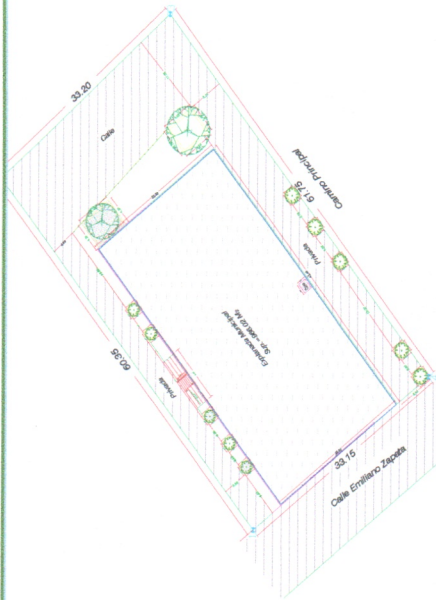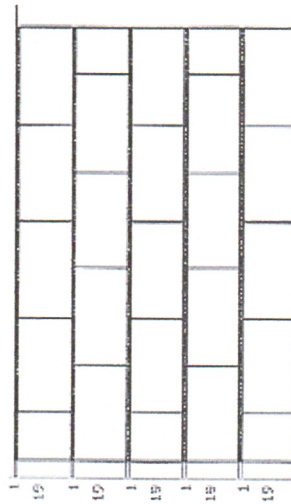




**NÚMEROS GENERADORES**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			ÁREA	PIEZA	VOLUMEN		CROQUIS
			EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO			PARCIAL	TOTAL	
CAS085	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2.3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 15 - 4. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO).	M	1	A	10.00			1.20	1.20	12.00	12.00	
		2	B	3.00			1.20	1.20	3.60	3.60		
		A	1	6.00			1.20	1.20	7.20	7.20		
TOTAL GENERADO										22.80		
COBRADO EN ESTA ESTIMACION										22.80		
ESTIMADO ANTERIOR:										0.00		
POR ESTIMAR										0.00		

REM0011	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO).	M2	1	A-B	18.00	0.72		12.96	1.00	12.96	12.96	
		2	B-A	5.00	0.72		3.60	1.00	3.60	3.60		
		A	1-2	17.70	0.72		12.74	2.00	25.49	25.49		
TOTAL GENERADO										42.05		
COBRADO EN ESTA ESTIMACION										42.05		
ESTIMADO ANTERIOR:										0.00		
POR ESTIMAR										0.00		

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXUTLA



CONTRATO NÚMERO:

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS

2 (DOS) FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA:

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

UBICACIÓN:

HUEHUEPIAXTLA

lunes, 7 de febrero de 2022

PERIODO DE EJECUCIÓN:

22 de diciembre de 2021

31 de enero de 2022

PERIODO DE CONTRATO:

15 de diciembre de 2021

31 de enero de 2022

HOJA: 7 DE 10



NÚMEROS GENERADORES


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			PIEZA	VOLUMEN		CROQUIS
			EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO		ÁREA	PARCIAL	
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M		LADO 1 LADO B	43.40 12.30			2.00 1.00	86.80 12.30	86.80 12.30	
								TOTAL GENERADO		99.10	
								COBRADO EN ESTA ESTIMACION		99.10	
								ESTIMADO ANTERIOR:		0.00	
								POR ESTIMAR		0.00	
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2								964.22	
										964.22	
								TOTAL GENERADO		964.22	
								COBRADO EN ESTA ESTIMACION		964.22	
								ESTIMADO ANTERIOR:		0.00	
								POR ESTIMAR		0.00	



NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		PIEZA	VOLUMEN		CROQUIS
		EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO		ALTO	ÁREA	
CANCH004	SUMINISTRACION Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 8 CM DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS.	CANCHAS DE BASQUETBOL:		PZA	TOTAL:	CANCHAS DE VOLEIBOL:			
		CIRCULOS:	11.31	3.00	33.83	PZA	TOTAL:		
BANDAS:	14.00	3.00	42.00	9.00	2.00	36.00	72.00		
	LINEA DE TRES:	28.00	2.00	56.00	34.00	2.00	68.00	136.00	
	LINEAS DE TIRO:	1.76	4.00	7.04					
		3.62	2.00	7.24					
		5.86	4.00	23.44					
	ZONA DE SEGURIDAD:	30.00	2.00	60.00					
		17.00	2.00	34.00					
	<b>TOTAL BASQUETBOL:</b>					<b>306.07</b>	<b>TOTAL FUTBOL:</b>	<b>45.70</b>	
							TOTAL GENERADO	423.77	
							COBRADO EN ESTA ESTIMACION	423.77	
							ESTIMADO ANTERIOR:	0.00	
							POR ESTIMAR:	0.00	

CANCH001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PARA CANCHA DE VOLEIBOL DE TUBO NEGRO C-40 DEC 0.65 M DE LONGITUD DE 3" DE DIAMETRO Y 2.5 M DE LONGITUD DE 2 1/2" DIAMETRO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE, TRABAJO TERMINADO.	PZA					2.00	2.00	2.00	
							TOTAL GENERADO	2.00		
							COBRADO EN ESTA ESTIMACION	2.00		
							ESTIMADO ANTERIOR:	0.00		
							POR ESTIMAR:	0.00		

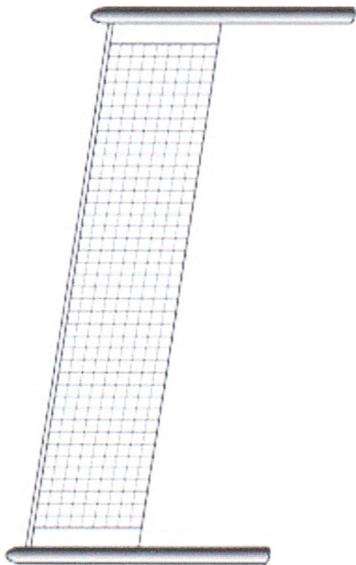

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXUTLA**

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS

2(DOS) FINIQUITO

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

FECHA DE ELABORACIÓN:

lunes, 7 de febrero de 2022

31 de enero de 2022  
31 de enero de 2022



HOJA: 9 DE 10

**NÚMEROS GENERADORES**

UBICACIÓN: HUEHUEPAXTLA

22 de diciembre de 2021  
15 de diciembre de 2021

AL  
AL

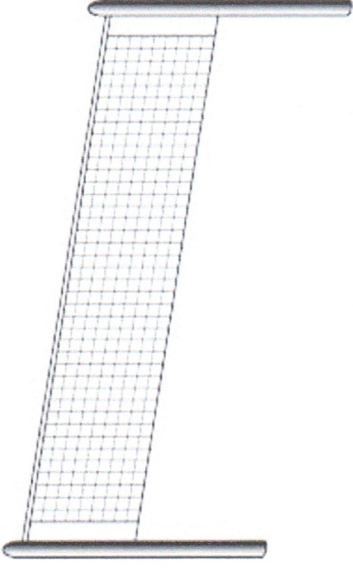CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN EJE	TRAMO	DIMENSIONES			ÁREA	PIEZA	VOLUMEN		CROQUIS
					LARGO	ANCHO	ALTO			PARCIAL	TOTAL	
CANCH013	SUMINISTRO DE RED DE VOLEIBOL	PZA						1.00		1.00	1.00	
S/C												
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LEDS MARCA SAMSUNG O SIMILAR MODELO WALLY-RN-75W BATERÍA DE LITIO Y PANEL SOLAR, INCLUYE: POSTE METÁLICO CÓNICO CIRCULAR DE 8 METROS CON PLACA BASE DE ACERO Y BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL 50X60X65 CM, BRAZO DE METAL DE 1M Y DE 2" DE DIÁMETRO.												
										TOTAL GENERADO		4.00
										COBRADO EN ESTA ESTIMACIÓN		0.00
										ESTIMADO ANTERIOR:		4.00
										POR ESTIMAR		0.00





**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXUTLA**

**CONTRATO NÚMERO:** MAX-OP-INV3-01/2021  
**NOMBRE DE LA OBRA:** DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

**DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS**

2 (DOS) FINIQUITO

**UBICACIÓN:** HUEHUEPIAXTLA  
**PERIODO DE EJECUCIÓN:** 22 de diciembre de 2021  
**PERIODO DE CONTRATO:** 15 de diciembre de 2021

**FECHA DE ELABORACIÓN:** AL 31 de enero de 2022  
 AL 31 de enero de 2022

lunes, 7 de febrero de 2022

**HOJA:** 10 DE 10



**NÚMEROS GENERADORES**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			PIEZA	VOLUMEN		CROQUIS
			EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO		ÁREA	PARCIAL	
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	ML			7.00	10.00	3.00		210.00	210.00	
<p>TOTAL GENERADO 210.00</p> <p>COBRADO EN ESTA ESTIMACION <b>210.00</b></p> <p>ESTIMADO ANTERIOR: 0.00</p> <p>POR ESTIMAR 0.00</p>											

*[Signature]*  
 T. ARQ. H. GARCÍA GONZÁLEZ  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN


*[Signature]*  
 ARO. ERRAIN PÉREZ LUIS  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y RESERVAS DE OBRAS

*[Signature]*  
 C. MARCO ANTONIO MONGE  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONS. AYUTLA PUEBLA  
 2021-2024

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 AXUTLA, PUEBLA  
 2021-2024


**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 AXUTLA, PUEBLA  
 2021-2024

10/10/10  
10/10/10  
10/10/10



10/10/10  
10/10/10  
10/10/10

10/10/10  
10/10/10  
10/10/10



10/10/10  
10/10/10  
10/10/10

10/10/10  
10/10/10  
10/10/10





**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXITLA**



CONTRATO NÚMERO: MAX-OP-INV3-01/2021 DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS 2(DOS) FINIQUITO  
 NOMBRE DE LA OBRA: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXITLA, PUEBLA. NÚMERO DE ESTIMACIÓN: 7 de febrero de 2022  
 UBICACIÓN: HUEHUEPIAXTLA FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de enero de 2022  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 22 de diciembre de 2021 AL 31 de enero de 2022  
 PERIODO DE CONTRATO: 15 de diciembre de 2021 AL 31 de enero de 2022


HOJA: 1 DE 4

**REPORTE FOTOGRÁFICO**




CONTRATISTA:  
  
 P. ARQ. OSCAR LUIS GONZALEZ  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN






AUTORIZO:  
  
 ARQ. EIRAN PÉREZ LUNA  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y RESIDENTE DE OBRA



AUTORIZO:  
  
 C. MARCO ANTONIO MONGE ZUÑIGA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

111-1074  
MAY 17 1967  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION







# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXUTLA

## DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS

CONTRATO NÚMERO: MAX-OP-INV3-01/2021  
NOMBRE DE LA OBRA: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

2(DOS) FINIQUITO

UBICACIÓN: HUEHUEPIAXTLA  
PERIODO DE EJECUCIÓN: 22 de diciembre de 2021  
PERIODO DE CONTRATO: 15 de diciembre de 2021

7 de febrero de 2022

HOJA: 2 DE 4



URBANA

CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES

### REPORTE FOTOGRÁFICO



REVISÓ: 2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
AXUTLA, PUEBLA

*[Signature]*  
ARQ. ESPERÁN PÉREZ LUINA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y RESIDENTE DE OBRA




PRESENCIA MUNICIPAL  
AXUTLA, PUEBLA  
2021-2024


AUTORIZO:  
*[Signature]*  
C. MARCO ANTONIO MONGE ZANJIGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CONTRATISTA:  
*[Signature]*  
P. ARQ. LEONARDO GONZÁLEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

STATE OF TEXAS  
COUNTY OF [illegible]



[illegible text]





# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXUTLA

## DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS

CONTRATO NÚMERO: MAX-OP-INV3-01/2021  
NOMBRE DE LA OBRA: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

2(DOS) FINIQUITO

UBICACIÓN: HUEHUEPIAXTLA  
PERIODO DE EJECUCIÓN: 22 de diciembre de 2021  
PERIODO DE CONTRATO: 15 de diciembre de 2021

7 de febrero de 2022


FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de enero de 2022  
AL 31 de enero de 2022

HOJA: 3 DE 4



URBANA  
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES

### REPORTE FOTOGRÁFICO

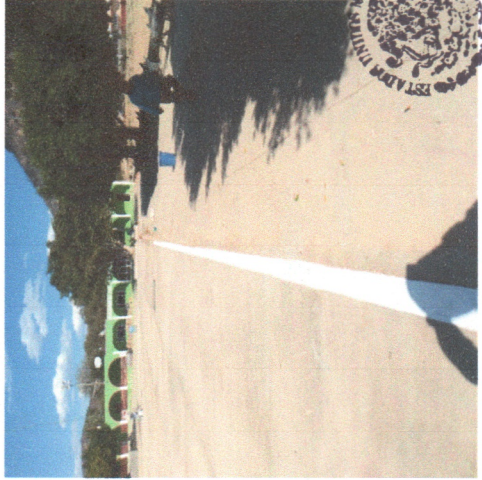

CONTRATISTA:

*[Signature]*  
P. ARQ. JUAN CARLOS GARCÍA GARCÍA  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN


REVISÓ

*[Signature]*  
ARQ. EFRÁIN PÉREZ LUNA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO:

*[Signature]*  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
C. MARCO ANTONIO MONTE ZUNIGA 2021-2024  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

STATE OF CALIFORNIA  
COUNTY OF SAN DIEGO






# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXUTLA


CONTRATO NÚMERO: MAX-OP-INV3-01/2021 DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS 2(DOS) FINIQUITO  
 NOMBRE DE LA OBRA: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA. NÚMERO DE ESTIMACIÓN: (DOS) FINIQUITO  
 UBICACIÓN: HUEHUEPIAXTLA FECHA DE ELABORACIÓN: 7 de febrero de 2022  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 22 de diciembre de 2021 AL 31 de enero de 2022  
 PERIODO DE CONTRATO: 15 de diciembre de 2021 AL 31 de enero de 2022





## REPORTE FOTOGRÁFICO

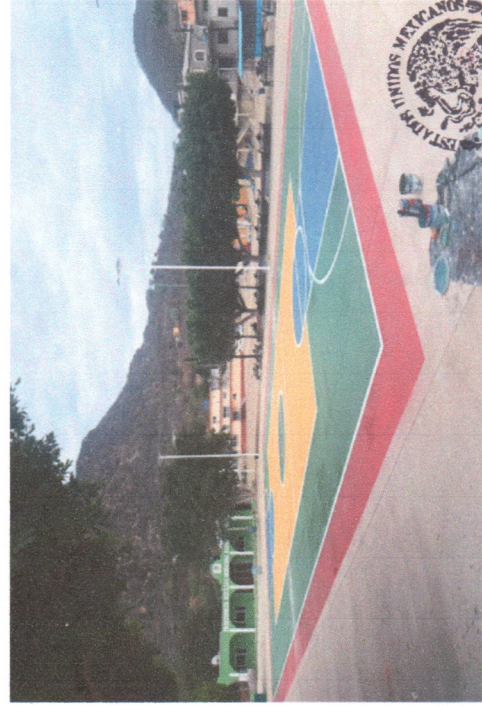

ASOCIACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 AXUTLA PUEBLA  
 2021-2024

CONTRATISTA:  
  
 P. ARQ. LEG. L. TOMÁS CORTÉS CORTÉS  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

REVISO:  
  
 ARQ. EFRAÍN PÉREZ LUNA  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO:  
  
 C. MARCO ANTONIO MONGE ZAMORA, A. PUEBLA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXUTLA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MAX-OP-INV3-01/2021

2(DOS) FINQUITO

CONTRATO NÚMERO:

NOMBRE DE LA OBRA:

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPXATLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

UBICACIÓN:

HUEHUEPXATLA

FECHA DE ELABORACIÓN:

lunes, 7 de febrero de 2022

PERIODO DE EJECUCIÓN:

AL

miércoles, 22 de diciembre de 2021

PERIODO DE CONTRATO:

AL

miércoles, 15 de diciembre de 2021


CONTRATISTA:

CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES

HOJA: 1 DE 2

PROGRAMA DE OBRA CONTRATADO

Table with columns: CLAVE, CONCEPTO, IMPORTE CONTRATADO, UNIDAD, PROGR., REAL, DICIEMBRE (15 AL 19 to 27 AL 31), ENERO (01 AL 02 to 31 AL 31), FEBRERO. Rows include LIM002, 11007, EXCA021, ACA090, REL1006, GUA001, MALL006, CON007, PICAC005, 31577, and CAS085. The table shows scheduled work with dates and budget amounts in pesos.





# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXUTLA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
NÚMERO DE ESTIMACIÓN:

MAX-OP-INV3.01/2021

2(DOS) FINIQUITO

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.



UBICACIÓN: HUEHUEPIAXTLA

FECHA DE ELABORACIÓN:

lunes, 7 de febrero de 2022

PERIODO DE EJECUCIÓN:

AL

lunes, 31 de enero de 2022

PERIODO DE CONTRATO:

AL

lunes, 31 de enero de 2022

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES

HOJA: 2 DE 2

## PROGRAMA DE OBRA CONTRATADO

CLAVE	CONCEPTO	PROGR.	UNIDAD	IMPORTE CONTRATADO	DICIEMBRE					ENERO					FEBRERO	
					15 AL 19	20 AL 26	27 AL 31	01 AL 02	03 AL 09	10 AL 16	17 AL 23	24 AL 30	31 AL 31			
REM001	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO).	PROGR.	M2	3,922.73					1,961.36			1,961.36				
		REAL	M2	3,922.73					1,961.36			1,961.36				
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PROGR.	M	3,726.87					3,726.87							
		REAL	M	3,726.87					3,726.87							
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	PROGR.	M2	8,433.46										8,433.46		
		REAL	M2	8,433.46										8,433.46		
CANCH004	SUMINISTRACION Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 8 CM DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACION DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS.	PROGR.	ML	16,978.94									16,978.94			
		REAL	ML	16,978.94									16,978.94			
CANCH001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PARA CANCHAS DE VOLIBOL DE TUBO NEGRO C-40 DEC 0.65 M DE LONGITUD DE 3" DE DIAMETRO Y 2.5 M DE LONGITUD DE 2 1/2" DIAMETRO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACION, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE. TRABAJO	PROGR.	PZA	6,612.00			6,612.00									
		REAL	PZA	6,612.00			6,612.00									
CANCH013	SUMINISTRO DE RED DE VOLEIBOL	PROGR.	PZA	679.01									679.01			
		REAL	PZA	679.01									679.01			
S/C	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LEDS MARCA SAMSUNG O SIMILAR MODELO WALLY-RN-73W BATERIA DE LITO Y PANEL SOLAR. INCLUYE: POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 8 METROS CON PLACA BASE DE ACERO Y BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL 50X60X65 CM. BRAZO DE METAL DE 1M Y DE 2" DE	PROGR.	ML	89,320.00												
		REAL	ML	89,320.00												
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	PROGR.	ML	8,258.04			2,752.68									
		REAL	ML	8,258.04			2,752.68									
		MONTO PROGR.		557,416.98	0.00	265,113.81	86,366.18	63,073.36	13,145.82	16,081.37	1,961.36	1,961.36	17,657.95	8,433.46	0.00	0.00
		MONTO REAL		399,304.28	0.00	158,998.36	34,368.93	63,073.36	13,145.82	16,081.37	1,961.36	1,961.36	17,657.95	8,433.46	0.00	0.00
		DIFERENCIA		158,112.70	0.00	106,115.45	51,997.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTRATISTA:



P. ARO. ESPECIALIZADO EN OBRAS CIVILES  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

REVISÓ:  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y RESIDENCIAS DE OBRA  
AXUTLA, PUEBLA  
2021-2024

AUTORIZÓ:  
C. MARCO ANTONIO PRINCESA MUNICIPIAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
AXUTLA, PUEBLA  
2021-2024



1000



1000
